
2018-06-04~2018-12-28 [계획:50.31% 실적:49.83%]

TEL IX I				계획진척:		일자 : : 2018-09-2	
WBS	작업*	비고 시작	∤일* 완료 열	초	계회	획 실적*	06/03 06/10 06/17 06/24 07/01 07/08 07/15 07/22 07/29 08/05 08/12 08/19 08/26 09/02 09/09 09/16 09/23 09/30 10/07 10/14 10/21 10/28 11/04 11/11 11/18 11/25 12/02 12/09 12/16 12/23
1	나업관리	2018	06-04 2018-12			0.70% 80.70%	
	착수 및 계획		06-04 2018-08			0.00% 100.009	
1.1.1	수행환경 구축(민간클라우드)		07-16 2018-08			0.00% 100.009	6100.00% 수행환경 구축(민간클라우드) 7/16-8/3
1.1.2 1.1.2.1	프로젝트 계획 수립 과업수행계획 수립		06-04 2018-06 06-04 2018-06			0.00% 100.009 0.00% 100.009	6
1.1.2.2	일정계획 수립		-06-04 2018-06			0.00% 100.009	
1.1.2.3 1.1.2.4	인력투입계획 수립		-06-04 2018-06 -06-04 2018-06			0.00% 100.009 0.00% 100.009	
1.1.2.5	교육계획 수립 이행계획 수립		-06-04 2018-06		-	0.00% 100.009	
1.1.3	프로젝트 계획 확정		06-15 2018-06			0.00% 100.009	
1.1.3.1 1.1.4	프로젝트계획 검토 및 승인		06-15 2018-06 06-22 2018-06			0.00% 100.009 0.00% 100.009	
1.1.4.1	착수보고 착수보고서 작성 및 검토		·06-22 2018-06			0.00% 100.009	
1.1.4.2	착수보고회		-06-28 2018-06			0.00% 100.009	
1.2.1	프로젝트 통제 범위관리		06-04 2018-12 06-18 2018-07			7.12% 77.129 0.00% 100.009	
1.2.1.1	범위관리-요구사항정의		06-18 2018-07			0.00% 100.009	
1.2.1.2	범위관리-유관부서 협의		07-09 2018-07			0.00% 100.00%	
1.2.1.2.1	범위관리-서울시청 관련부서 협의 범위관리-강남구청 내 관련부서 협의		07-16 2018-07 07-09 2018-07			0.00% 100.009 0.00% 100.009	
1.2.1.2.3	범위관리-주관부서 협의		07-16 2018-07			0.00% 100.009	WORLD THE UNION
1.2.2	월간보고		07-05 2018-12			0.00% 50.00%	
1.2.2.1	6월간보고 7월간보고 7월간보고		-07-05 2018-07 -08-02 2018-08			0.00% 100.009 0.00% 100.009	
1.2.2.3	8월간보고		09-06 2018-09			0.00% 100.009	■ 100.00% 8월간보고 9/6-9/6
1.2.2.4	9월간보고		-10-01 2018-10		0	0.00% 0.009	
1.2.2.5 1.2.2.6	10월간보고 11월간보고		-11-01 2018-11 -12-06 2018-12		0	0.00% 0.009 0.00% 0.009	
1.2.3	중간보고		10-04 2018-10		0	0.00% 0.00%	
1.2.3.1	중간보고서 작성 및 검토		10-04 2018-10		0	0.00% 0.009	
1.2.3.2 1.2.4	중간보고회 완료보고		10-11 2018-10 12-20 2018-12		0	0.00% 0.009 0.00% 0.009	
1.2.4.1	완료보고서 작성 및 검토		12-20 2018-12		0	0.00% 0.00%	
1.2.4.2	완료보고회		12-26 2018-12		0	0.00% 0.009	
1.2.5 1.2.5.1	품질보증 문서표준 정의		-06-04 2018-12 -06-15 2018-06			6.60% 76.60% 0.00% 100.00%	
1.2.5.2	품질보증 계획 수립		-06-04 2018-06			0.00% 100.009	
1.2.5.3	품질목표 정의		06-04 2018-06			0.00% 100.009	
1.2.5.4 1.2.5.5	품질대상 및 범위 정의		06-04 2018-06 06-22 2018-12			0.00% 100.009 9.01% 69.019	
1.2.5.5.1	단계별 품질보증활동 분석단계		·06-22 2018-07			0.00% 100.009	
1.2.5.5.1.1	분석단계 산출물 작성 교육		-06-22 2018-06		2 1	0.00% 100.009	==== 100.00% 분석단계 산출물 작성 교육 6/22-6/25
1.2.5.5.1.2	분석단계 산출물 체크리스트, 품질지표 작성		06-26 2018-06			0.00% 100.009	
1.2.5.5.1.3 1.2.5.5.1.4	분석단계 품질검토 및 결과 보고 분 석단계 품질검토 시정조치 결과 확인 (DROP)		-07-02 2018-07 -07-06 2018-07			0.00% 100.009 0.00% 100.009	
1.2.5.5.2	설계단계		-07-12 2018-09	-30 26	26 1	0.00% 100.009	
1.2.5.5.2.1	설계단계 산출물 작성 교육		07-12 2018-07			0.00% 100.009	
1.2.5.5.2.2 1.2.5.5.2.3	설계단계 산출물 체크리스트, 품질지표 작성 설계단계 품질검토 및 결과 보고		07-19 2018-07 -09-04 2018-09			0.00% 100.009 0.00% 100.009	
1.2.5.5.2.4	설계단계 품질검토 시정조치 결과 확인		09-05 2018-09			0.00% 100.009	100.00% 설계단계 품질검토 시정조치 결 <mark>과</mark> 확인 9/5-9/30
1.2.5.5.3	구축단계		08-27 2018-12			0.00% 50.009	
1.2.5.5.3.1 1.2.5.5.3.2	구현단계 산출물 작성 교육 구현단계 산출물 체크리스트, 품질지표 작성		-08-27 2018-08 -08-27 2018-08			0.00% 100.009 0.00% 100.009	
1.2.5.5.3.3	구현단계 품질검토 및 결과 보고		11-26 2018-11			0.00% 0.00%	
1.2.5.5.3.4	구현단계 품질검토 시정조치 결과 확인		11-29 2018-12		0	0.00% 0.009	
1.2.5.5.4 1.2.5.5.4.1	테스트 및 이행단계 테스트 및 이행단계 산출물 작성 교육		10-27 2018-12 -10-27 2018-10		0	0.00% 0.009 0.00% 0.009	
1.2.5.5.4.2	테스트단계 산출물 체크리스트, 품질지표 작성	변경 2018	11-01 2018-11		0	0.00% 0.009	
1.2.5.5.4.3	테스트단계 품질검토 및 결과 보고		12-07 2018-12		0	0.00% 0.009	
1.2.5.5.4.4 1.3	교육 테스트단계 품질검토 시정조치 결과 확인		-12-13 2018-12 -06-22 2018-07			0.00% 0.00% 0.00% 100.00%	
1.3.1	보안 교육	2018	-06-22 2018-06	-25 2		0.00% 100.009	
1.3.2	개인정보보호 교육		07-23 2018-07			0.00% 100.009	
1.4.1	프로젝트 종료 준공검수 요청		12-13 2018-12 -12-13 2018-12		0	0.00% 0.009 0.00% 0.009	
1.4.2	준공검수	2018	12-19 2018-12	-28 7	0	0.00% 0.009	0.00% 준공검수 12/19-12/28
1.4.3	프로젝트 완료보고		-12-27 2018-12 -06-15 2018-12		0 142	0.00% 0.009 6.41% 45.919	
2.1	강남구 스마트시티 모바일 서비스 구축 분석단계		-06-15 2018-17 -06-15 2018-07			6.41% 45.919 0.00% 100.009	
2.1.1	현황조사(서울시청 시스템, 강남구청 현행 시스템 현황)	2018	-06-15 2018-07	-05 15	15 1	0.00% 100.009	100.00% 현황조사(서울시청 시스템, 강남구청 현행 시스템 현황) 6/15-7/5
2.1.2 2.2	담당자 인터뷰(주관부서 및 관련실국)		-06-25 2018-07 -07-16 2018-08			0.00% 100.009 0.00% 100.009	- The state of the
2.2.1	설계단계 정보구조 설계 및 서비스 UX 설계		-07-16 2018-08 -07-16 2018-08			0.00% 100.009	
2.2.2	데이터 관리 체계 설계	2018	-07-30 2018-08	-03 5	5 1	0.00% 100.009	100.00% 데 이터 관리 체계 설계 7/30-8/3
2.2.3	MCI 시스템과 서비스 연계 설계		07-30 2018-08			0.00% 100.009	
2.2.4	디자인 시안 (컨셉 정의 1단계) 메인디자인 시안 제작 (2종 작업)		-08-06 2018-08 -08-20 2018-08			0.00% 100.009 0.00% 100.009	
2.3		2018	08-05 2018-11	-16 201	62	0.85% 30.109	30.10% 구축단계 8/5-11/16
2.3.1	데이터 처리부 개발		-08-27 2018-09 -08-05 2018-11			0.00% 100.009 2.17% 50.009	
2.3.2	서비스 UI/UX 개발 전자지도/증강현실 부 개발		-08-05 2018-11 -09-21 2018-11			8.33% 8.339	
2.3.4	위치기반 처리 부 개발 (비콘연계 포함)	2018	10-22 2018-11	-16 20	0	0.00% 0.009	0.00% 위치기반 처리 부 개발 (비콘연계 포함) 10/22-11/16
2.3.5	주민투표 처리부 개발	12 120	09-21 2018-11		3	8.33% 8.339	
2.3.6 2.4	데이터시각화/공유경제 처리 부 개발 시험단계		10-22 2018-11 -11-19 2018-12		0 0	0.00% 0.009 0.00% 0.009	
2.4.1	단위시험		11-19 2018-11		0	0.00% 0.00%	0.0% 단위시험 11/19-11/20
2.4.2	통합시험		11-29 2018-12		0	0.00% 0.009	
2.5 2.5.1	이행단계 인수시험		-12-21 2018-12 -12-21 2018-12		0	0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	
2.5.1			12-21 2018-12			0.00% 0.009	
2.6.1	운영자 매뉴얼 작성	2018	12-17 2018-12	-20 4	0	0.00% 0.009	0.00% 운영자 매뉴얼 작성 12/17-12/20
2.6.2 2.7	운영자 교육 거스다게		12-26 2018-12 12-19 2018-12		0	0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	
2.7.1	검수단계 시스템 구현 검수		12-19 2018-12			0.00% 0.009	

XLGantt ©http://xlworks.net

3.1	남구 데이터허브 시스템 (CMS/MCI)		2018-06-05	2018-12-28	243	96	39.51%	38.2
	분석단계		2018-06-05	2018-07-02	8	8	100.00%	100.0
3.1.1	현황조사(연계방식, 스키마, 데이터)	지연	2018-06-29	2018-07-02	2	2	100.00%	100.0
3.1.2	담당자 인터뷰(운영 유지보수)		2018-06-05	2018-06-09	3	3	100.00%	100.0
3.1.3	시스템 환경 분석	지연	2018-06-12	2018-06-15	3	3	100.00%	100.0
3.2	설계단계		2018-06-16	2018-08-07	39	39	100.00%	100.0
3.2.1	통합 데이터베이스 설계		2018-06-16	2018-06-22	5	5	100.00%	100.0
3.2.2	메타데이터 및 정보 분류 체계 설계		2018-06-23	2018-06-26	2	2	100.00%	100.0
3.2.3			2018-06-27	2018-07-17	15	15	100.00%	100.
	콘텐츠 관리 기능 설계							
3.2.4	전문 통신부 처리 기능 설계		2018-06-27	2018-06-28	2	2	100.00%	100.
3.2.5	인증/보안 통신 모델 설계		2018-07-18	2018-08-07	15	15	100.00%	100.
3.3	구축단계		2018-08-08	2018-12-07	159	49	30.82%	28
3.3.1	통합 데이터베이스 구축 및 생성		2018-08-08	2018-08-21	9	9	100.00%	100
3.3.2	연계 데이터 수집/적재 처리 (1차, 주기적 현행화)		2018-08-24	2018-12-07	71	23	32.39%	28
3.3.3	콘텐츠 관리 기능 개발	변경	2018-09-03	2018-09-28	17	17	100.00%	100
3.3.4	통계 화면 개발	변경	2018-11-15	2018-11-30	12	0	0.00%	0
3.3.5	전문 통신 처리부 개발	변경	2018-10-01	2018-11-14	31	0	0.00%	0
					19	0		
3.3.6	비콘 정보 및 연계 콘텐츠 맵핑 부 개발	변경	2018-10-08	2018-11-02			0.00%	0
3.4	시험단계		2018-11-13	2018-11-17	4	0	0.00%	0
3.4.1	단위테스트(전문/메타데이터)	변경	2018-11-13	2018-11-17	4	0	0.00%	0
3.5	이행단계		2018-11-19	2018-11-30	10	0	0.00%	0
3.5.1	DB 마이그레이션 및 응용 프로그램 설치	변경	2018-11-19	2018-11-30	10	0	0.00%	0
3.6	교육단계		2018-12-17	2018-12-28	7	0	0.00%	0
3.6.1	운영자 매뉴얼 작성		2018-12-17	2018-12-20	4	0	0.00%	0
3.6.2			2018-12-17	2018-12-20	3	0	0.00%	0
	운영자 교육							
3.7	검수단계		2018-12-19	2018-12-28	7	0	0.00%	0
3.7.1	시스템 구현 검수		2018-12-19	2018-12-28	7	0	0.00%	0
3.8	안정화단계		2018-12-17	2018-12-28	9	0	0.00%	0
3.8.1	모니터링		2018-12-17	2018-12-28	9	0	0.00%	0
4 J	물인터넷 센서 구축		2018-06-29	2018-12-28	93	41	44.09%	44
4.1	분석단계		2018-06-29	2018-07-23	23	23	100.00%	100
4.1.1			2018-06-29	2018-07-13	11	11	100.00%	100
	현황 조사(강남구 요구 사항 확인 및 현장 환경 검토)							
4.1.2	담당자 인터뷰(주관부서 및 관광진흥과)		2018-07-16	2018-07-23	6	6	100.00%	100
4.1.3	설치 지역 특성 및 이슈 검토 (한전, 민간 건물 등)		2018-07-16	2018-07-23	6	6	100.00%	100
4.2	설계단계		2018-07-24	2018-09-04	18	18	100.00%	100
4.2.1	사물인터넷 존 플래닝 (4대 거리 및 주요 거점)		2018-07-24	2018-07-30	5	5	100.00%	100
4.2.2	상세 설치 거점 실사		2018-08-01	2018-08-16	11	11	100.00%	100
4.2.3	비콘 센서 설치 계획 최종 검토 (주관기관, 관련 민/관 담당)	변경	2018-09-03	2018-09-04	2	2	100.00%	100
4.3		L'8	2018-10-08	2018-11-02	33	0	0.00%	0
	구현단계							
4.3.1	테스트 환경 2 Zone 구축 (강남구청 내 1 Zone, 수행사 1 Zone)	변경	2018-10-08	2018-10-12	4	0	0.00%	(
4.3.2	4대 거리 비콘 설치 진행	변경	2018-10-08	2018-11-02	19	0	0.00%	(
4.3.3	교통 거점/공공 시설 비콘 설치 진행	변경	2018-10-22	2018-11-02	10	0	0.00%	(
4.4	시험단계		2018-10-15	2018-10-26	10	0	0.00%	(
4.4.1	센서 연동 시험		2018-10-15	2018-10-26	10	0	0.00%	(
4.5	이행단계		2018-11-20	2018-11-21	2	0	0.00%	(
4.5.1			2018-11-20	2018-11-21	2	0	0.00%	
	인수 시험					-	4.447.	
4.6	검수단계		2018-12-19	2018-12-28	7	0	0.00%	(
4.6.1	수량 및 설치 완료 검수		2018-12-19	2018-12-28	7	0	0.00%	(
5 클	라우드 기반 운영계 시스템 구축		2018-08-06	2018-12-28	51	19	37.25%	37
5.1	분석단계		2018-08-06	2018-08-17	14	14	100.00%	100
5.1.1	시스템 구성 방안 정의		2018-08-06	2018-08-10	5	5	100.00%	100
5.1.2	담당자 인터뷰(운영 유지보수)		2018-08-06	2018-08-10	5	5	100.00%	100
5.1.3			2018-08-00	2018-08-17	4	4	100.00%	100
	클라우드 환경 용량 산정							
5.2	설계단계		2018-08-17	2018-08-23	5	5	100.00%	100
5.2.1	인프라 설계(이중화 구성 및 3-Tier 모델)		2018-08-17	2018-08-23	5	5	100.00%	100
5.3	구축단계		2018-11-16	2018-11-26	7	0	0.00%	(
5.3.1	운영시스템 설치 및 네트워크 오픈		2018-11-16	2018-11-19	2	0	0.00%	(
5.3.2	운영 소프트웨어 설치 및 응용프로그램 이행		2018-11-20	2018-11-22	3	0	0.00%	(
	데이터베이스 구축 및 데이터 마이그레이션		2018-11-23	2018-11-26	2	0	0.00%	(
5.3.3	시험단계		2018-11-29	2018-12-07	7	0	0.00%	
	Metal			2018-12-07	7	0		
5.4	目気 11気						0.00%	(
5.4 5.4.1	통합시험		2018-11-29			0	0.00%	(
5.4 5.4.1 5.5	이행단계		2018-12-21	2018-12-24	2			
5.4 5.4.1 5.5 5.5.1			2018-12-21 2018-12-21	2018-12-24 2018-12-24	2	0	0.00%	
5.4 5.4.1 5.5	이행단계		2018-12-21	2018-12-24			0.00% 0.00%	
5.4 5.4.1 5.5 5.5.1	이행단계 인수시험 검수단계		2018-12-21 2018-12-21	2018-12-24 2018-12-24	2	0		0
5.4 5.4.1 5.5 5.5.1 5.6	이행단계 인수시형 검수단계 시스템 구현 검수		2018-12-21 2018-12-21 2018-12-19	2018-12-24 2018-12-24 2018-12-28	2 7	0	0.00%	0
5.4 5.4.1 5.5 5.5.1 5.6 5.6.1 5.7	이행단계 인수시험 검수단계 시스템 구현 검수 안정화단계		2018-12-21 2018-12-21 2018-12-19 2018-12-19 2018-12-17	2018-12-24 2018-12-24 2018-12-28 2018-12-28 2018-12-28	2 7 7 9	0 0 0	0.00% 0.00% 0.00%	0
5.4 5.4.1 5.5 5.5.1 5.6 5.6.1 5.7	이행단계 인수시험 검수단계 시스템 구현 검수 안정화단계 모니터링		2018-12-21 2018-12-21 2018-12-19 2018-12-19 2018-12-17 2018-12-17	2018-12-24 2018-12-24 2018-12-28 2018-12-28 2018-12-28 2018-12-28	2 7 7 9	0 0 0 0	0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0
5.4 5.4.1 5.5 5.5.1 5.6 5.6.1 5.7 5.7.1	이행단계 인수시험 검수단계 시스템 구현 검수 안정화단계 모니터링 가제안 수행		2018-12-21 2018-12-21 2018-12-19 2018-12-19 2018-12-17 2018-12-17 2018-09-03	2018-12-24 2018-12-24 2018-12-28 2018-12-28 2018-12-28 2018-12-28 2018-12-07	2 7 7 9 9	0 0 0 0	0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 12.24%	0 0 0
5.4 5.4.1 5.5 5.5.1 5.6 5.6.1 5.7 5.7.1 6 추	이행단계 인수시험 검수단계 시스템 구현 검수 안정화단계 모니터링 가제안 수행 강남봇 기능 확대		2018-12-21 2018-12-21 2018-12-19 2018-12-19 2018-12-17 2018-12-17 2018-09-03 2018-09-03	2018-12-24 2018-12-24 2018-12-28 2018-12-28 2018-12-28 2018-12-28 2018-12-07 2018-12-07	2 7 7 9 9 49	0 0 0 0 0 0 6	0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 12.24% 9.38%	0 0 0 12
5.4 5.4.1 5.5 5.5.1 5.6 5.6.1 5.7 5.7.1 6 추 6.1	이행단계 인수시험 검수단계 시스템 구현 검수 안정화단계 모니터링 가제안 수행		2018-12-21 2018-12-21 2018-12-19 2018-12-19 2018-12-17 2018-12-17 2018-09-03	2018-12-24 2018-12-24 2018-12-28 2018-12-28 2018-12-28 2018-12-28 2018-12-07	2 7 7 9 9 49 32 3	0 0 0 0	0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 12.24%	12
5.4 5.4.1 5.5 5.5.1 5.6 5.6.1 5.7 5.7.1 6 추	이행단계 인수시험 검수단계 시스템 구현 검수 안정화단계 모니터링 가제안 수행 강남봇 기능 확대		2018-12-21 2018-12-21 2018-12-19 2018-12-19 2018-12-17 2018-12-17 2018-09-03 2018-09-03	2018-12-24 2018-12-24 2018-12-28 2018-12-28 2018-12-28 2018-12-28 2018-12-07 2018-12-07	2 7 7 9 9 49	0 0 0 0 0 0 6	0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 12.24% 9.38%	(((12 9
5.4 5.4.1 5.5 5.5.1 5.6 5.6.1 5.7 5.7.1 6 추 6.1 6.1.1 6.1.2	이행단계 인수시험 검수단계 시스템 구현 검수 안정화단계 모니터링 가제안 수행 강남봇 기능 확대 목표 요구사항 정의 지능형 데이터 수급 (민원지식베이스 데이터)		2018-12-21 2018-12-21 2018-12-19 2018-12-17 2018-12-17 2018-09-03 2018-09-03 2018-09-03 2018-11-06	2018-12-24 2018-12-24 2018-12-28 2018-12-28 2018-12-28 2018-12-28 2018-12-07 2018-12-07 2018-12-16	2 7 7 9 9 49 32 3	0 0 0 0 0 0 6 3	0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 12.24% 9.38% 100.00%	() () () () () () ()
5.4 5.5 5.5.1 5.6 5.6.1 5.7 5.7.1 6 李 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3	이행단계 인수시험 검수단계 시스템 구현 검수 안정화단계 모니터링 가제안 수행 강남봇 기능 확대 목표 요구사항 정의 지능형 데이터 수급 (민원지식베이스 데이터) 패턴 분석 및 인텐트 설계		2018-12-21 2018-12-21 2018-12-19 2018-12-17 2018-12-17 2018-12-17 2018-09-03 2018-09-03 2018-11-06 2018-11-19	2018-12-24 2018-12-24 2018-12-28 2018-12-28 2018-12-28 2018-12-28 2018-12-07 2018-12-07 2018-09-05 2018-11-16 2018-11-23	2 7 7 9 9 49 32 3	0 0 0 0 0 6 3 3	0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 12.24% 9.38% 100.00% 0.00%	12 9 100 0
5.4 5.5 5.5 5.6 5.6.1 5.7 5.7.1 6 李 6.1.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4	이행단계 인수시험 검수단계 시스템 구현 검수 안정화단계 모니터링 가제안 수행 강남 봇 기능 확대 목표 요구사항 정의 지능형 데이터 구급 (민원지식베이스 데이터) 패턴 분석 및 인텐트 설계 지피지기 AI 엔진 설치		2018-12-21 2018-12-21 2018-12-19 2018-12-17 2018-12-17 2018-12-17 2018-09-03 2018-09-03 2018-09-03 2018-11-06 2018-11-19	2018-12-24 2018-12-24 2018-12-28 2018-12-28 2018-12-28 2018-12-28 2018-12-07 2018-12-07 2018-09-05 2018-11-16 2018-11-23 2018-11-30	2 7 7 9 9 9 49 32 3 9 5 5 5	0 0 0 0 0 6 3 3 0	0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 12.24% 9.38% 100.00% 0.00% 0.00%	0 0 0 12 9 100 0
5.4 5.4.1 5.5 5.5.1 5.6 5.6.1 5.7 5.7.1 6 추 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5	이행단계		2018-12-21 2018-12-21 2018-12-19 2018-12-19 2018-12-17 2018-12-17 2018-9-03 2018-09-03 2018-11-05 2018-11-19 2018-11-25 2018-12-03	2018-12-24 2018-12-28 2018-12-28 2018-12-28 2018-12-28 2018-12-27 2018-12-07 2018-12-07 2018-11-16 2018-11-23 2018-11-30 2018-12-07	2 7 7 9 9 49 32 3 9 5 5 5 5	0 0 0 0 0 0 6 3 3 0 0	0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 12.24% 9.38% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0 0 0 12 9 100 0 0
5.4 5.4.1 5.5 5.5.1 5.6 5.6.1 5.7 5.7.1 6 추 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6	이행단계 인수시형 검수단계 시스템 구현 검수 안정화단계 모니터링 가제안 수행 강남봇 기능 확대 목표 요구사항 정의 지능형 데이터 수급 (민원지식베이스 데이터) 패턴 분석 및 인텐트 설계 지피지기 데 엔진 설치 패턴 데어터/지능형 데이터 적용 스마트시티 모바일 서비스 연계 적용		2018-12-21 2018-12-21 2018-12-19 2018-12-19 2018-12-17 2018-12-17 2018-09-03 2018-09-03 2018-09-03 2018-11-06 2018-11-19 2018-11-20 2018-12-03	2018-12-24 2018-12-28 2018-12-28 2018-12-28 2018-12-28 2018-12-07 2018-12-07 2018-12-07 2018-11-16 2018-11-23 2018-11-20 2018-12-07	2 7 7 9 9 9 49 32 3 9 5 5 5 5 5 5	0 0 0 0 0 0 6 3 3 0 0	0.00% 0.00% 0.00% 12.24% 9.38% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0 0 0 12 9 100 0 0
5.4 5.4.1 5.5 5.5.1 5.6 5.6.1 5.7 6.7 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.2	이행단계 인수시험 검수단계 시스템 구현 검수 안정화단계 모니터링 가제안 수행 강남봇 기능 확대 목표 요구사항 정의 지능형 데이터 수급 (민원지식베이스 데이터) 패턴 분석 및 인텐트 설계 지피지기 AI 엔진 설치 패턴 데이터/지능형 데이터 적용 스마트시티 모바일 서비스 연계 적용 구청장에게 바란다 기능 구축		2018-12-21 2018-12-21 2018-12-19 2018-12-19 2018-12-17 2018-12-17 2018-09-03 2018-09-03 2018-09-03 2018-11-06 2018-11-19 2018-11-26 2018-12-03 2018-12-03 2018-12-03 2018-12-03	2018-12-24 2018-12-28 2018-12-28 2018-12-28 2018-12-28 2018-12-07 2018-12-07 2018-12-07 2018-11-16 2018-11-13 2018-11-30 2018-11-30 2018-11-30	2	0 0 0 0 0 6 3 3 0 0 0	0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 12.24% 9.38% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 17.65%	0 0 0 12 9 100 0 0 0 0
5.4 5.4.1 5.5 5.5.1 5.6 5.6.1 5.7 5.7.1 6 추 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6	이행단계 인수시형 검수단계 시스템 구현 검수 안정화단계 모니터링 가제안 수행 강남봇 기능 확대 목표 요구사항 정의 지능형 데이터 수급 (민원지식베이스 데이터) 패턴 분석 및 인텐트 설계 지피지기 데 엔진 설치 패턴 데어터/지능형 데이터 적용 스마트시티 모바일 서비스 연계 적용		2018-12-21 2018-12-21 2018-12-19 2018-12-19 2018-12-17 2018-12-17 2018-09-03 2018-09-03 2018-09-03 2018-11-06 2018-11-19 2018-11-20 2018-12-03	2018-12-24 2018-12-28 2018-12-28 2018-12-28 2018-12-28 2018-12-07 2018-12-07 2018-12-07 2018-11-16 2018-11-23 2018-11-20 2018-12-07	2 7 7 9 9 9 49 32 3 9 5 5 5 5 5 5	0 0 0 0 0 0 6 3 3 0 0	0.00% 0.00% 0.00% 12.24% 9.38% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0 0 0 12 9 100 0 0 0 0
5.4 5.4.1 5.5 5.5.1 5.6 5.6.1 5.7 6.7 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.2	이행단계 인수시험 검수단계 시스템 구현 검수 안정화단계 모니터링 가제안 수행 강남봇 기능 확대 목표 요구사항 정의 지능형 데이터 수급 (민원지식베이스 데이터) 패턴 분석 및 인텐트 설계 지피지기 AI 엔진 설치 패턴 데이터/지능형 데이터 적용 스마트시티 모바일 서비스 연계 적용 구청장에게 바란다 기능 구축		2018-12-21 2018-12-21 2018-12-19 2018-12-19 2018-12-17 2018-12-17 2018-09-03 2018-09-03 2018-09-03 2018-11-06 2018-11-19 2018-11-26 2018-12-03 2018-12-03 2018-12-03 2018-12-03	2018-12-24 2018-12-28 2018-12-28 2018-12-28 2018-12-28 2018-12-07 2018-12-07 2018-12-07 2018-11-16 2018-11-13 2018-11-30 2018-11-30 2018-11-30	2	0 0 0 0 0 6 3 3 0 0 0	0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 12.24% 9.38% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 17.65%	0 0 0 0 0 122 9 100 0 0 0 0 0 17 100

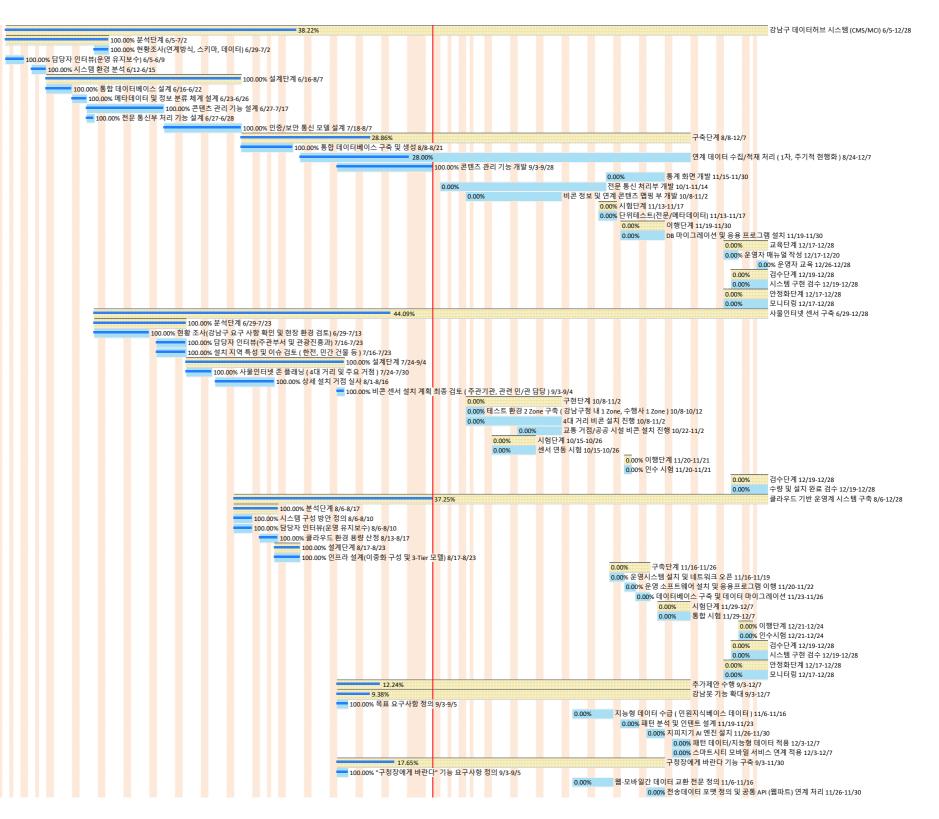

XLGantt ©http://xlworks.net 2/2
